

SICREDI NOROESTE RS

RELATÓRIO SEMANAL 32

27/04/2020



Obra: Sicredi Noroeste RS

Localização: Esquina da Rua
Horizontalina com Rua Santa Helena
(Lote 12 da quadra 20, Três de Maio/RS)

Área Construída: 5.372,28 m²

Duração: 18 meses

INTRODUÇÃO

- Este relatório tem como objetivo apresentar o planejamento da Obra Sicredi Noroeste RS, juntamente com as atividades executadas na semana do dia 20/04 à 26/04.

					Semana					32	Início		07/10/2019		
					20/04/2020					à 26/04/2020					Data: 16/04/2020
ID	Empreiteiro	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração		20 S	21 T	22 Q	23 Q	24 S	25 S.	26 D	% Exec	Causas
1	FININHO	Montagem armadura positiva Laje 3º Pav.	20-abr	21-abr	2	P	X	X						100%	
						E									
2	FININHO	Montagem de armadura de colapso Laje 3º Pav.	22-abr	23-abr	2	P			X	X				100%	
						E									
3	PTE	Instalação dos espaçadores e barras de apoio para os cabos de protensão.	20-abr	23-abr	4	P	X	X	X	X				100%	
						E									
4	PTE	Instalação dos cabos de protensão longitudinais e transversais do 3º Pav.	21-abr	23-abr	3	P		X	X	X				100%	
						E									
5	FININHO	Montagem dos painéis externos das vigas de perímetro 3º Pav.	20-abr	22-abr	3	P	X	X	X					100%	
						E									
6	ANDORA	Montagem e Manutenção do Guarda-corpo de Perímetro do 3º Pav.	20-abr	24-abr	5	P	X	X	X	X	X			100%	
						E									
7	FININHO	Conclusão do Travamento das Torres e Escoras do 3º Pav.	22-abr	23-abr	2	P			X	X				100%	
						E									
8	FININHO / MH PISOS	Concretagem da Laje do 3º Pav + Escadas 1 e 2.	24-abr	24-abr	1	P					X			100%	
						E									
9	ANDORA	Cura úmida laje 3º Pav.	25-abr	25-abr	1	P						X		100%	
						E									
10	ANDORA	Manutenção das Proteções de Periferia Térreo e 2º Pav.	20-abr	24-abr	5	P	X	X	X	X	X			100%	
						E									

11	FININHO	Fabricação das vigas de perímetro da Cobertura.	24-abr	25-abr	2	P					X	X		100%	
						E									
12	ANDORA	Manutenção, limpeza e organização do Canteiro.	20-abr	24-abr	5	P	X	X	X	X	X			100%	


- Montagem dos Cabos de Protensão 3º Pav.
- Concretagem da Laje 3º Pav.
- Estudo e orçamento dos projetos de instalações e climatização.
- Instalação de iluminação provisória do SS.
- Prospeção e contratação de MO e insumos para Alvenaria.
- Limpeza e organização de todo canteiro de obras.



Laje desformada do 2º Pav

Içamento dos cabos de protensão




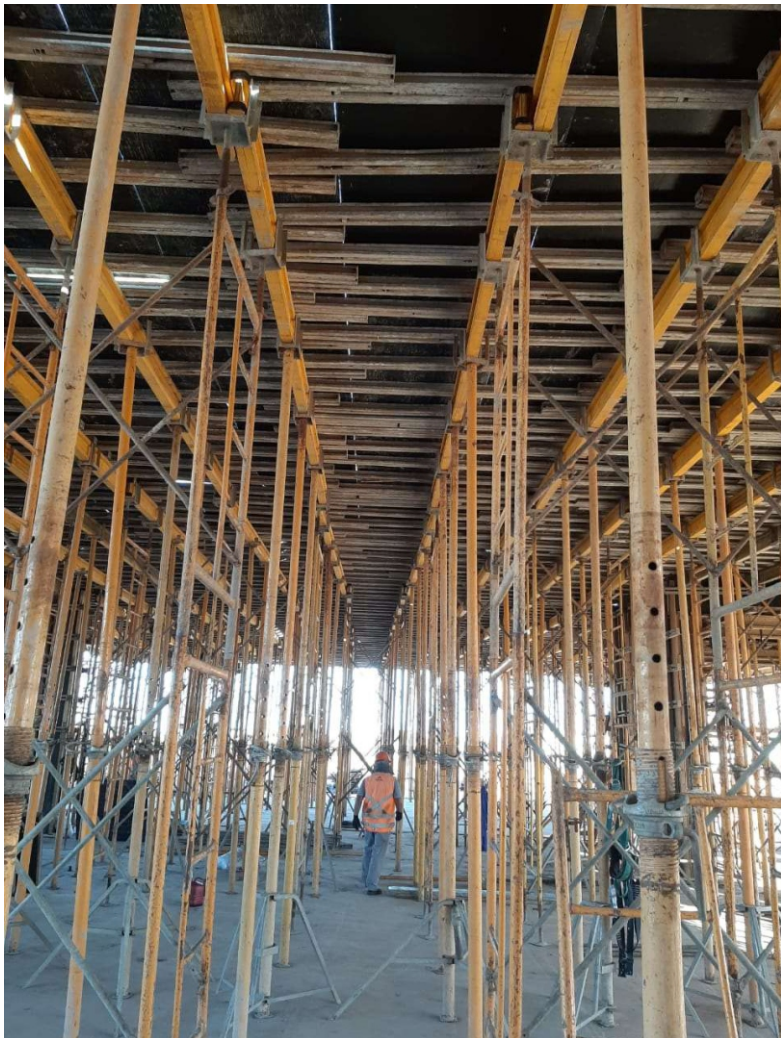

Laje 3º Pav
Escorada e
Barroteada



Laje 3º Pav com
as ancoragens
instaladas

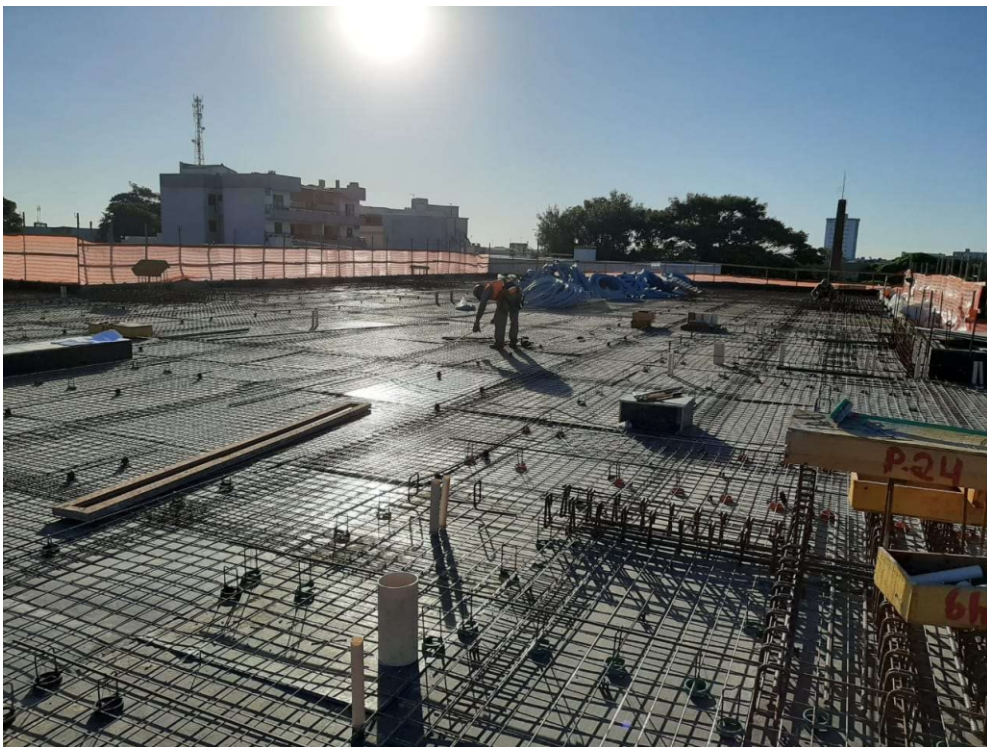

Armadura positiva e punção 3º Pav.

Lançamento dos cabos transversais do 3º Pav.





Protensão
passiva 3º Pav



Cabos
transversais e
longitudinais
3º Pav

Cabos
transversais e
longitudinais
3º Pav



Armadura de
fretagem





Lavagem da laje para concretagem 3º Pav

Escada 2 - 3º Pav




Armadura de
fretagem e cabos
passivo 3º Pav.





Manutenção do Guarda-corpo de perímetro

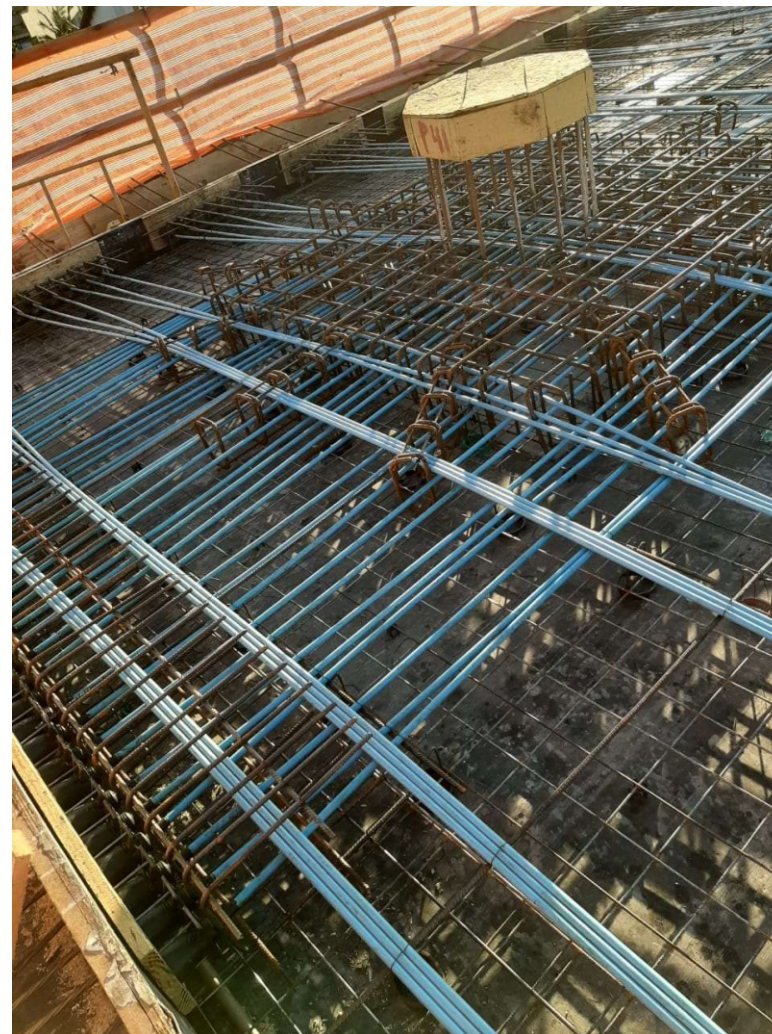

Cabos de protensão e armadura de Punção 3º Pav.



Acabamento dos cabos transversais 3º Pav.



Laje 2º Pav desformada.




Concretagem Laje 3º Pav.





Concretagem Laje 3º Pav.

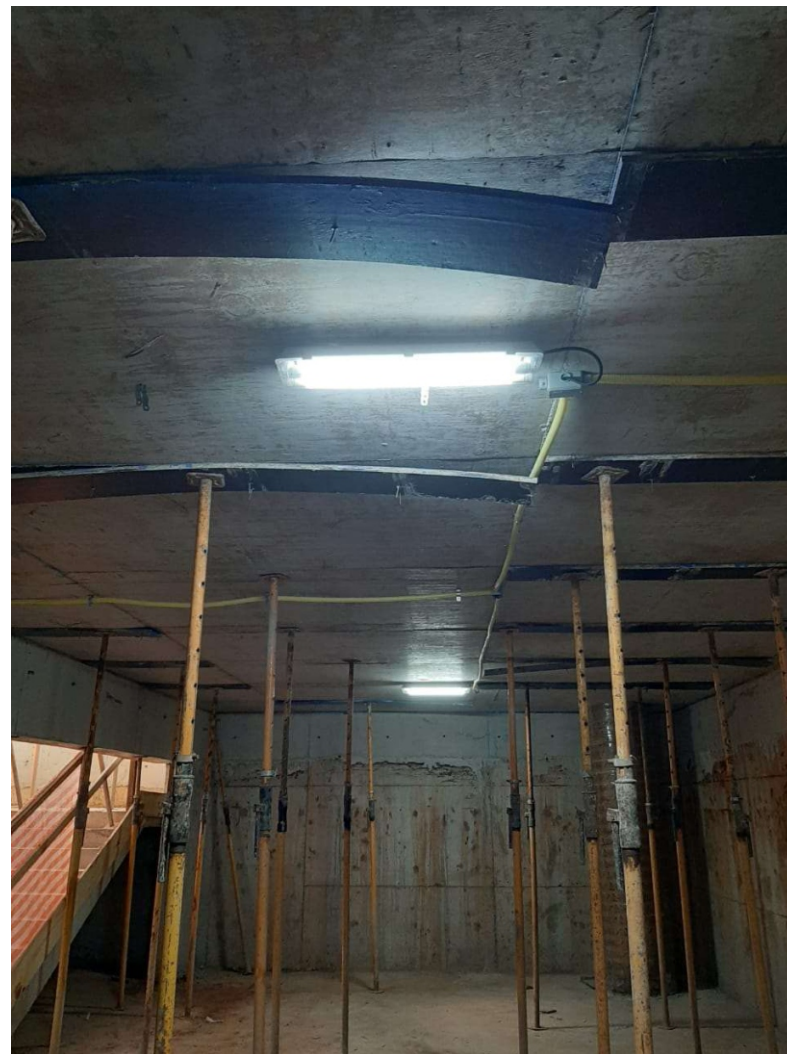

Iluminação Provisória SS



Iluminação Provisória SS



Concretagem Laje 3º Pav.





Concretagem Laje 3º Pav.






Concretagem Laje 3º Pav.



Sede Sicredi Noroeste RS

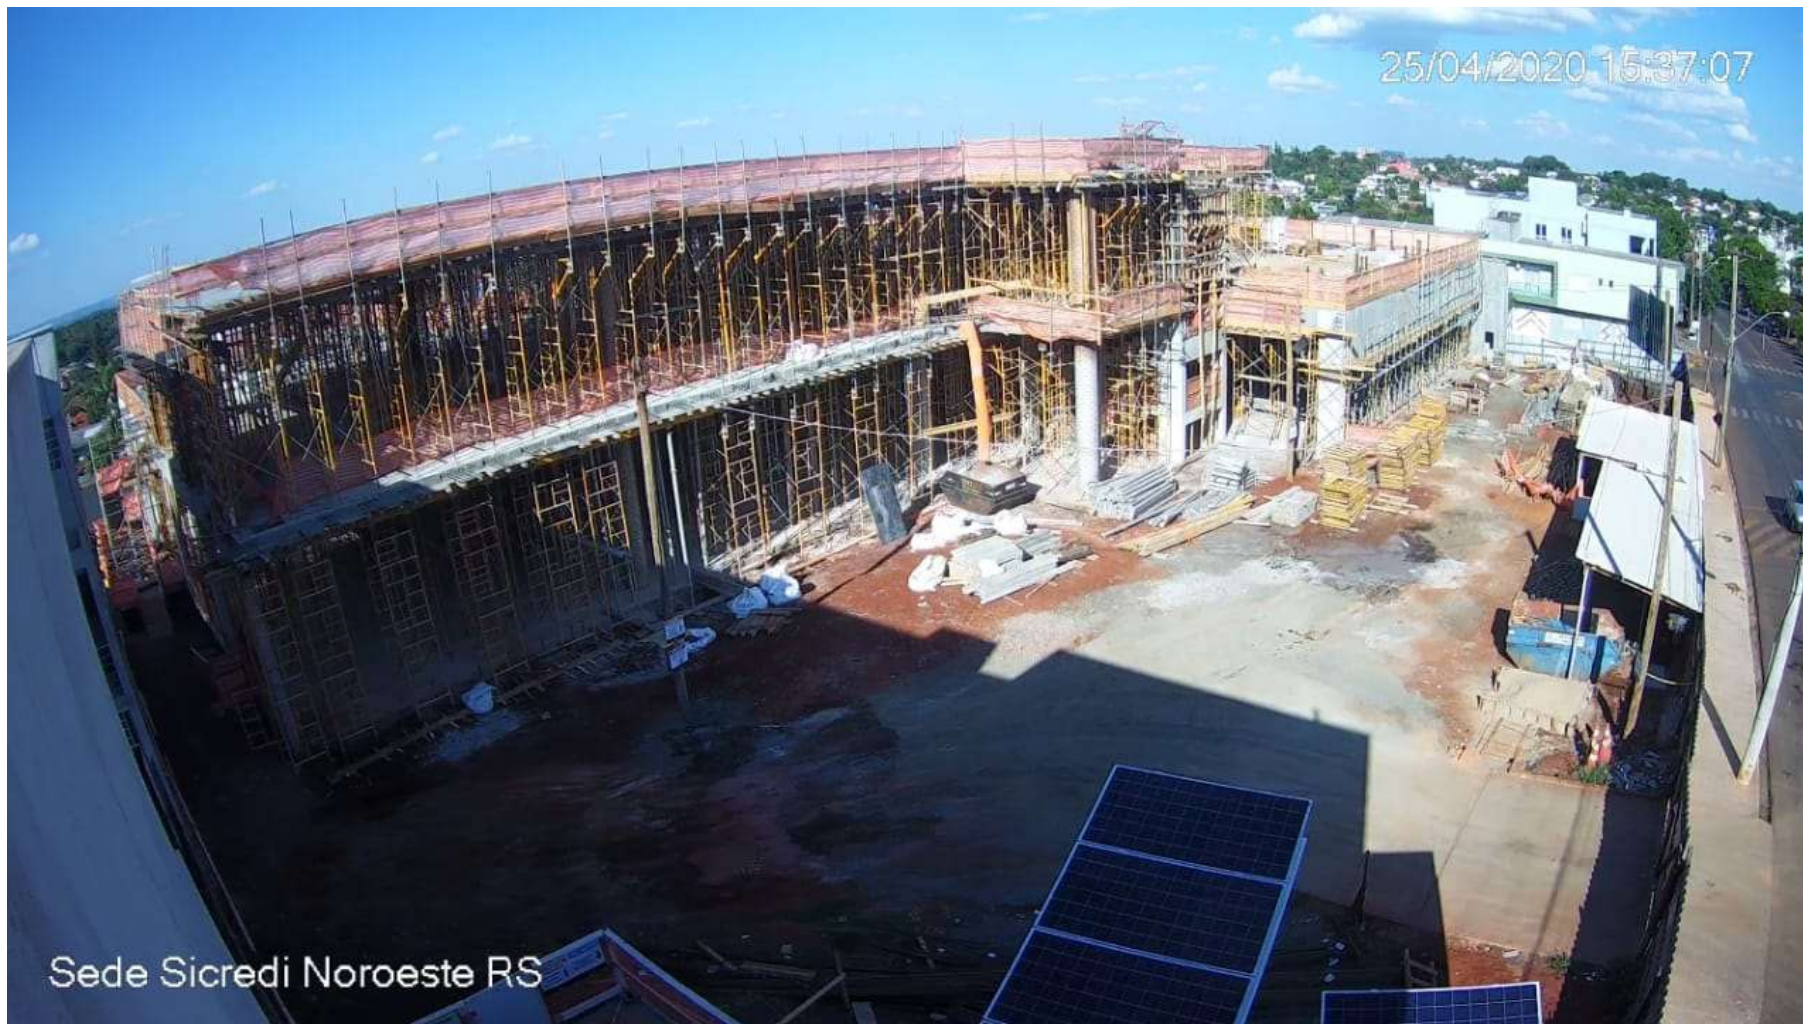

DESTINAÇÃO DAS APLICAÇÕES

Especificação dos itens	Valor R\$
Construtora Contrato	6.314.159,59
Terrenos	4.195.000,00
Projetos Contrato	512.220,00
Gerenciamento Contrato	407.823,60
Taxas e Tributos	168.856,47
Tapumes - Limpeza - honorários- Maquete - outdoor - sondagem terreno	63.958,55
Móveis e Equip (Container)	35.189,66
Projetos exceto Contrato	43.000,00
Obra CEI	7.601,72
Comunicação	7.680,00
Total - até 05/05/2020	11.755.489,59



ANDORN

C O N S T R U Ç Õ E S
